

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)



DATA INÍCIO DO RELATÓRIO: 10/06/2026

NÚMERO DO DIÁRIO

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

DIAS TRABALHADOS

SALDO DO PRAZO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS - IPREM

MÃO-DE-OBRA INDIRETA

MÃO-DE-OBRA DIRETA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	2	Betoneira 400 litros	1
		Pedreiro	2	Carrinho de mão	2
		Mestre de obras	1	Pá	2
		Armador	1	Trena	2
		Eletricista	1	Lixadeira	1
		Gesseiro	2	Furadeira	1
		Pintor	4	Nível a laser	1
				Enxada	2
				Torquês	1
		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA 14

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS 13

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã x	Manhã	Manhã	inserir valor
Tarde x	Tarde	Tarde	
Noite x	Noite	Noite	

Observação:

Pluviometria Total (mm)

Mês

Ano

Contrato

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Documento assinado digitalmente



PEDRO HENRIQUE BORGES RESENDE

Data: 24/06/2026 09:21:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO - FOTOS

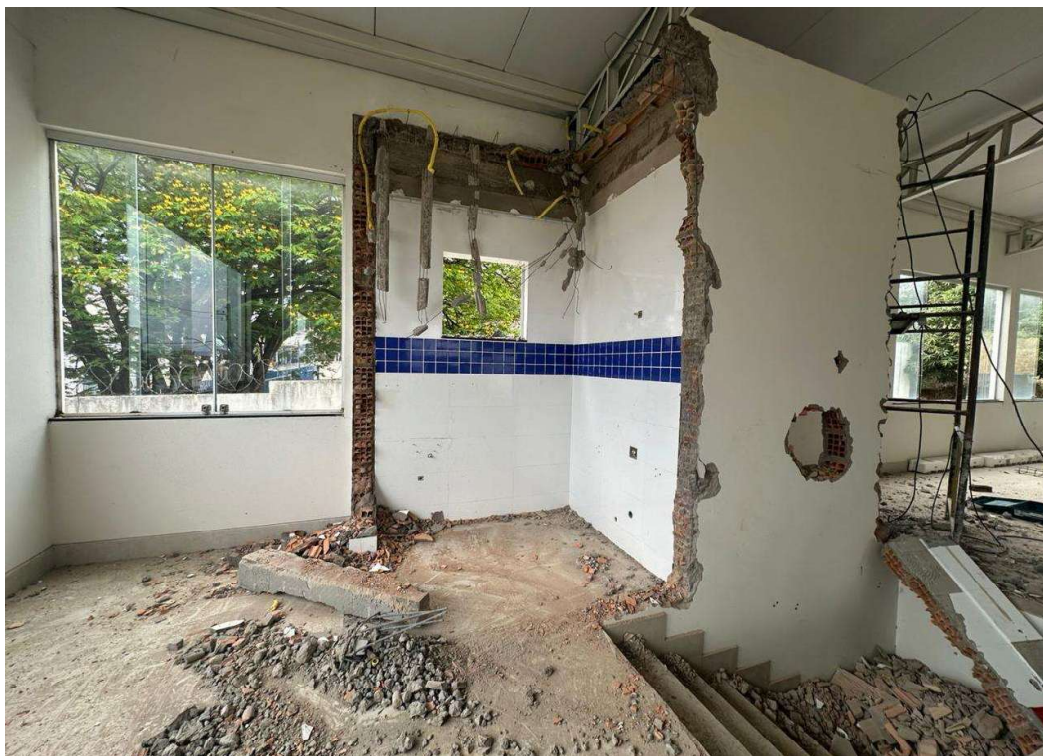


FOTO 1 - DEMOLIÇÃO.

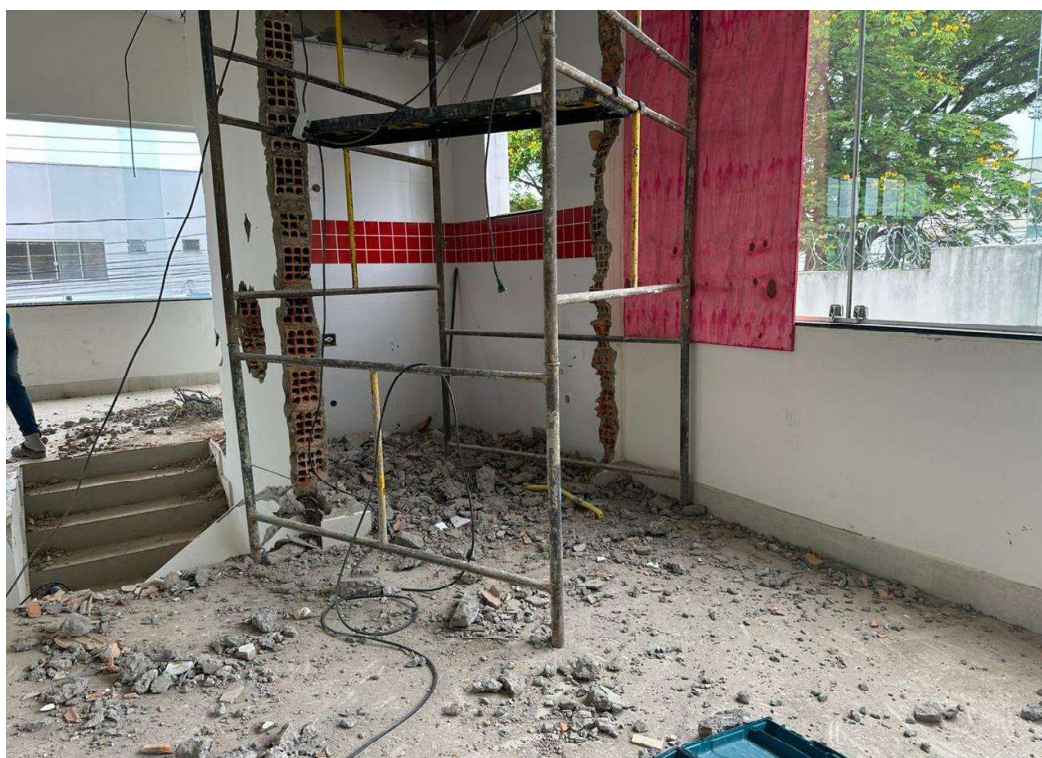


FOTO 2 - DEMOLIÇÃO.

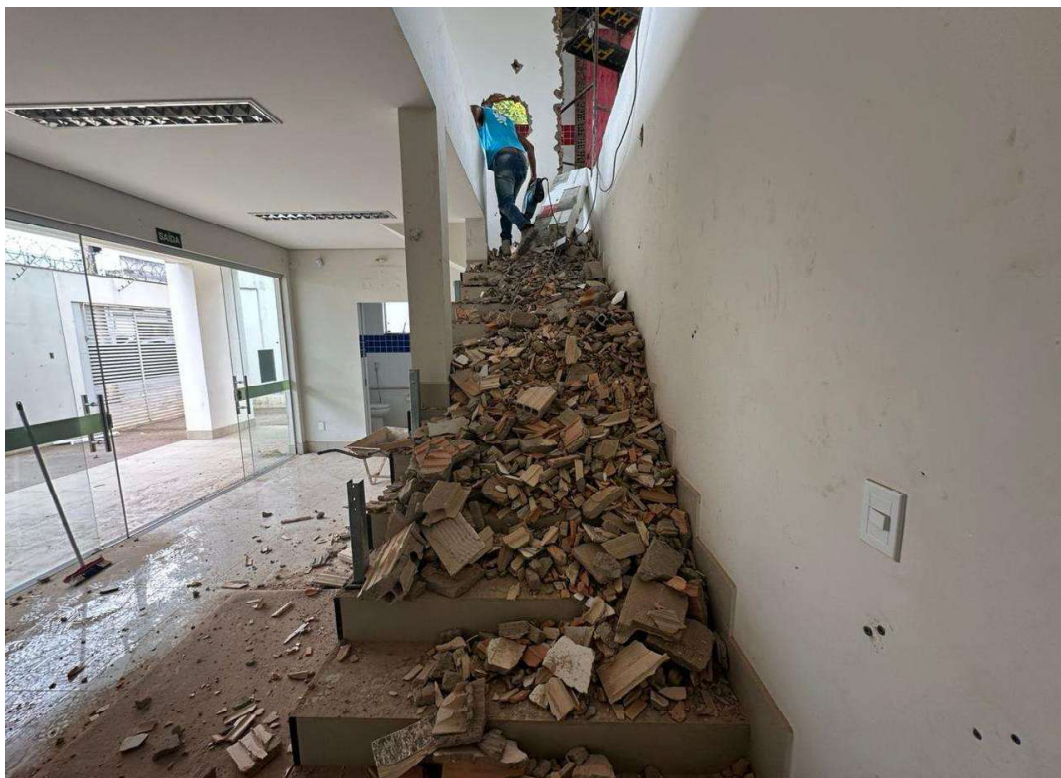


FOTO 3 - DEMOLIÇÃO.



FOTO 4 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO. REMOÇÃO DE PISO.



FOTO 5 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA. REMOÇÃO DE PISO.



FOTO 6 - DEMOLIÇÃO.



FOTO 7 - EXECUÇÃO DE LAJE.



FOTO 8 - CONCRETAGEM DE LAJE.



FOTO 9 - RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO.



FOTO 10 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO.



FOTO 11 - EXECUÇÃO DE REBOCO. ASSENTAMENTO DE PISO.



FOTO 12 - ASSENTAMENTO DE PISO.



FOTO 13 - EXECUÇÃO DE PILAR PARA AUMENTO DE VÃO DO PORTÃO.

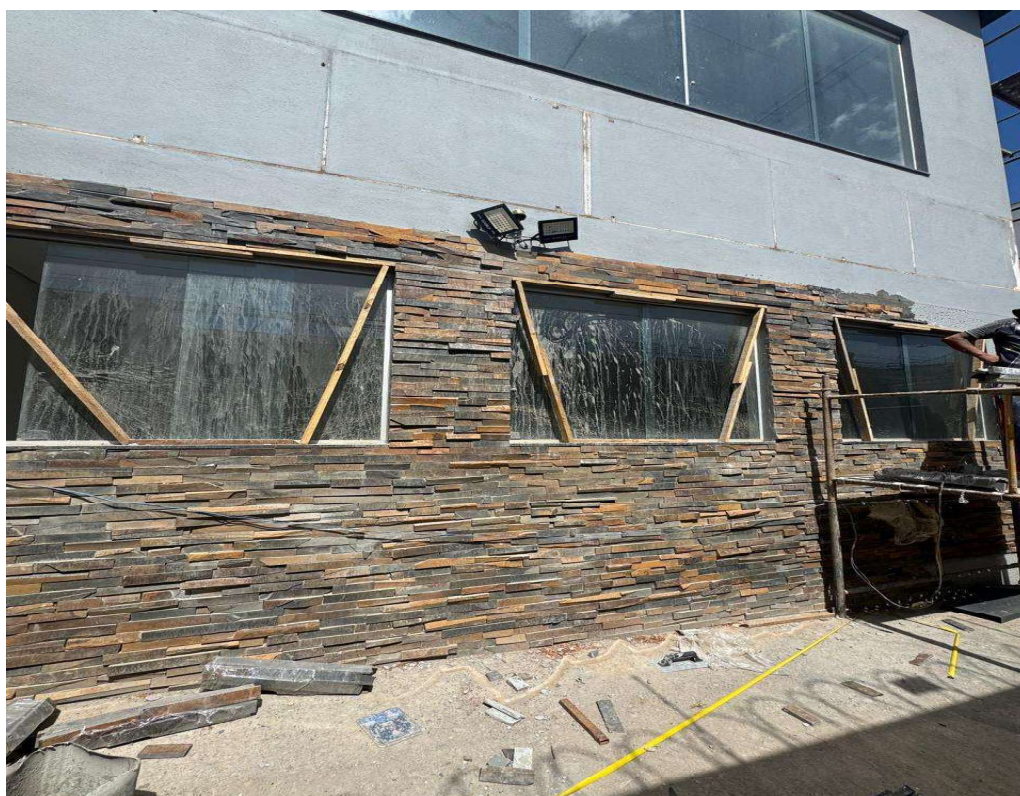


FOTO 14 - INSTALAÇÃO DE PEDRA FERRO.



FOTO 15 - INSTALAÇÃO DE PEDRA FERRO. RASGO DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA E DE AR CONDICIONADO.



FOTO 16 - INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO.



FOTO 17 - INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO. EXECUÇÃO DE PINTURA DOS PORTÕES.



FOTO 18 - INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ACESSÍVEL. ASSENTAMENTO DE PISO E RODAPÉ. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE PORTAS. INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.



FOTO 19 - ASSENTAMENTO DE PISO E RODAPÉ. EXECUÇÃO DE PINTURA.

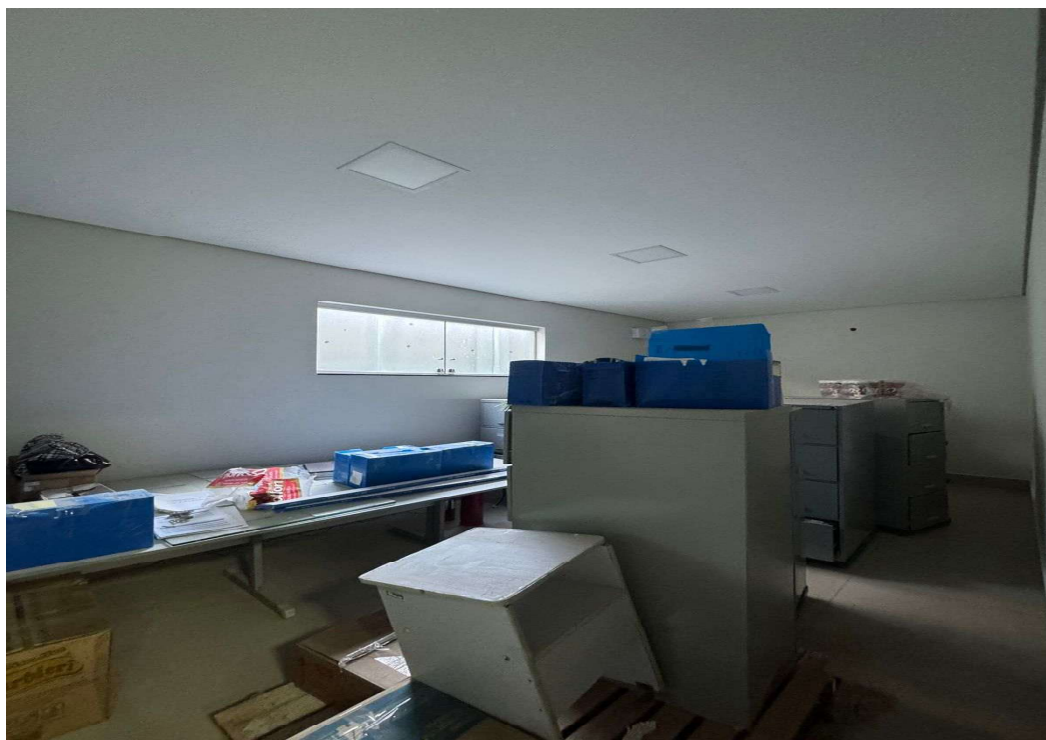


FOTO 20 - EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.

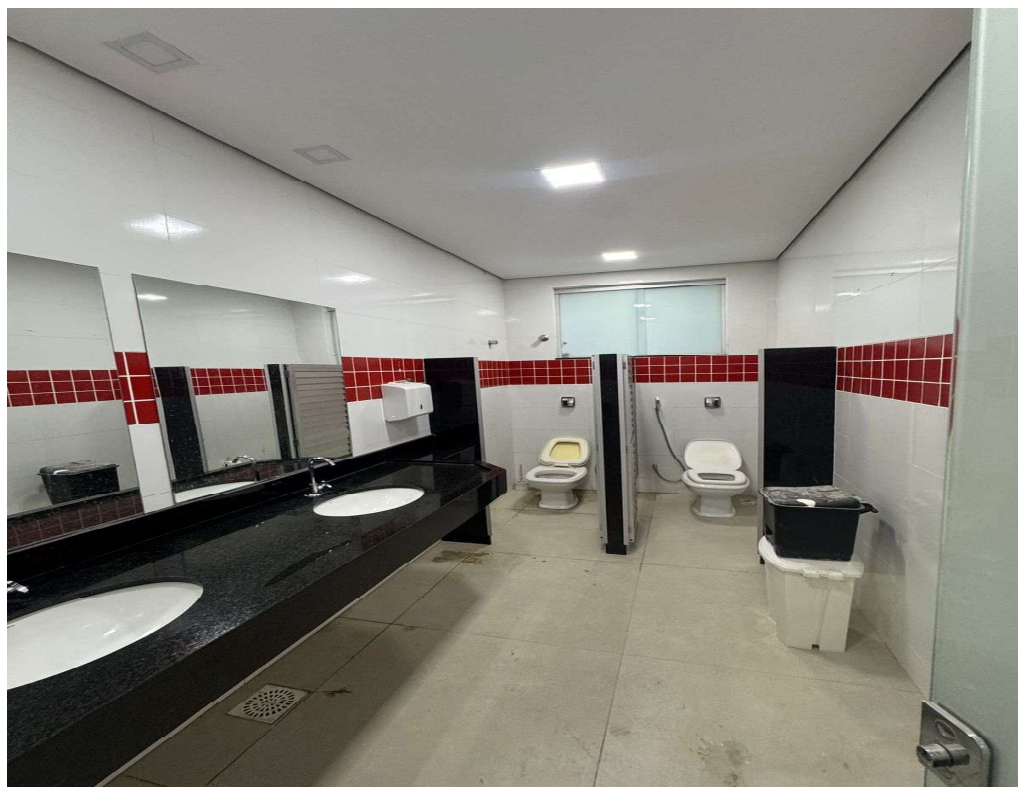


FOTO 21 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE VÁLVULA.

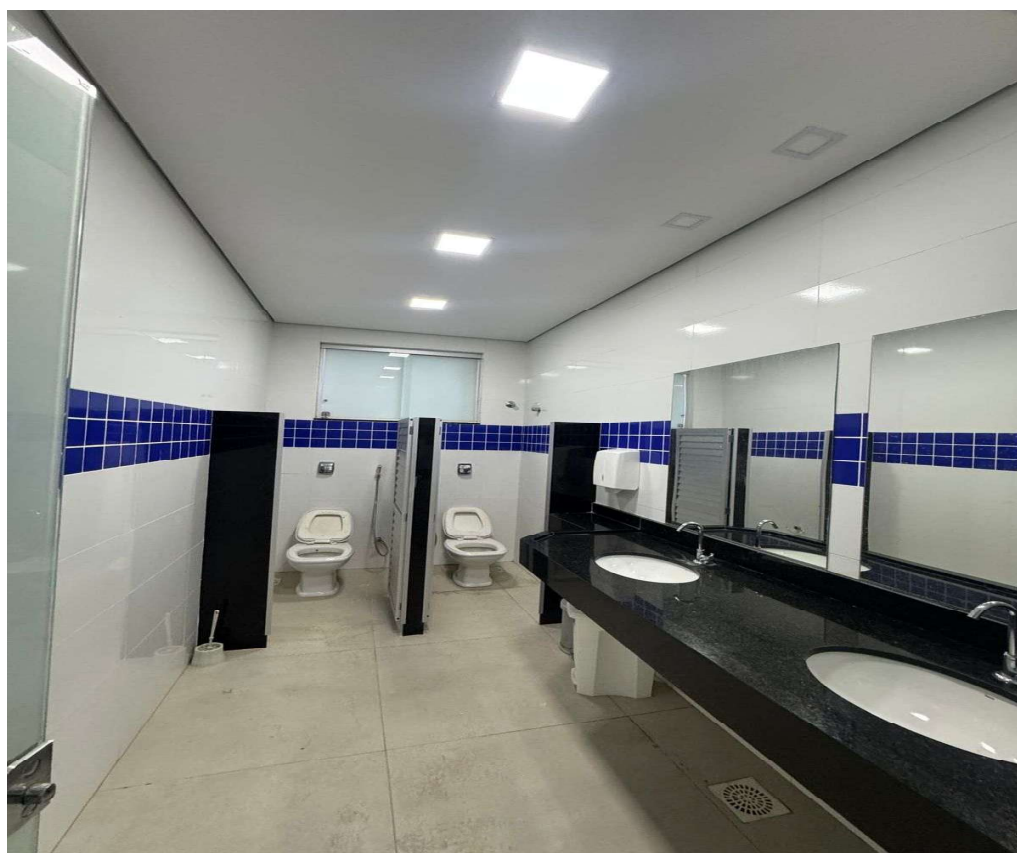


FOTO 22 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.



FOTO 23 - EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO.



FOTO 24 - EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.



FOTO 25 - EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.

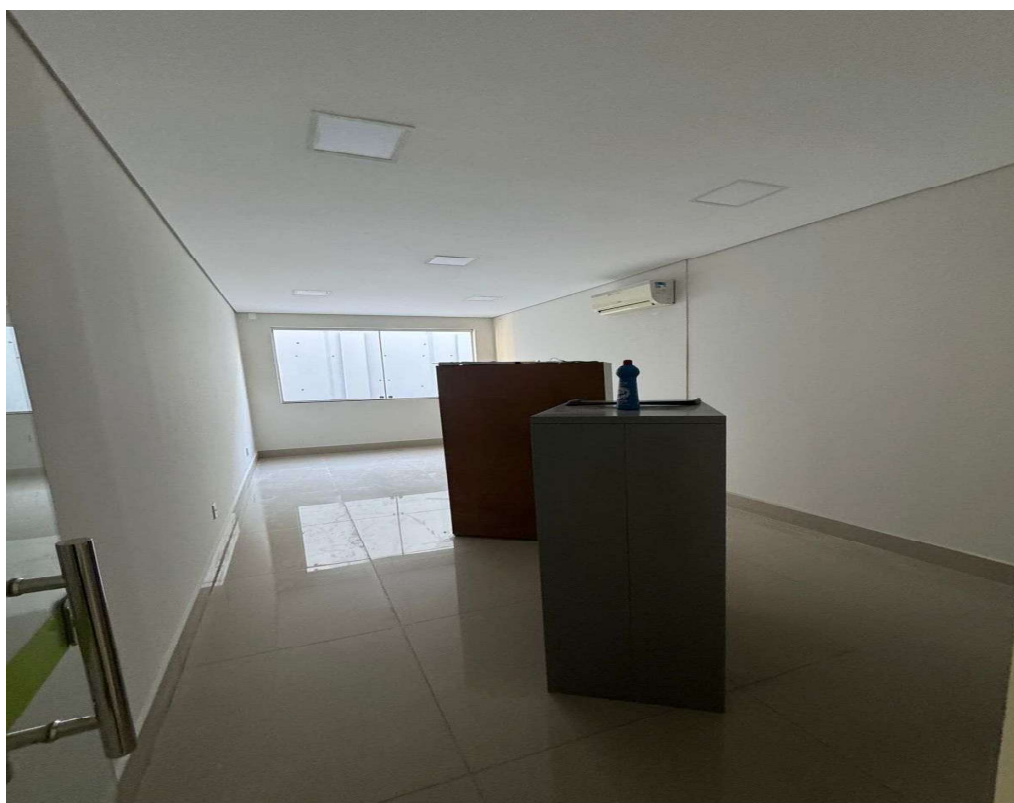


FOTO 26 - EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.



FOTO 27 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.



FOTO 28 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.



FOTO 29 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.

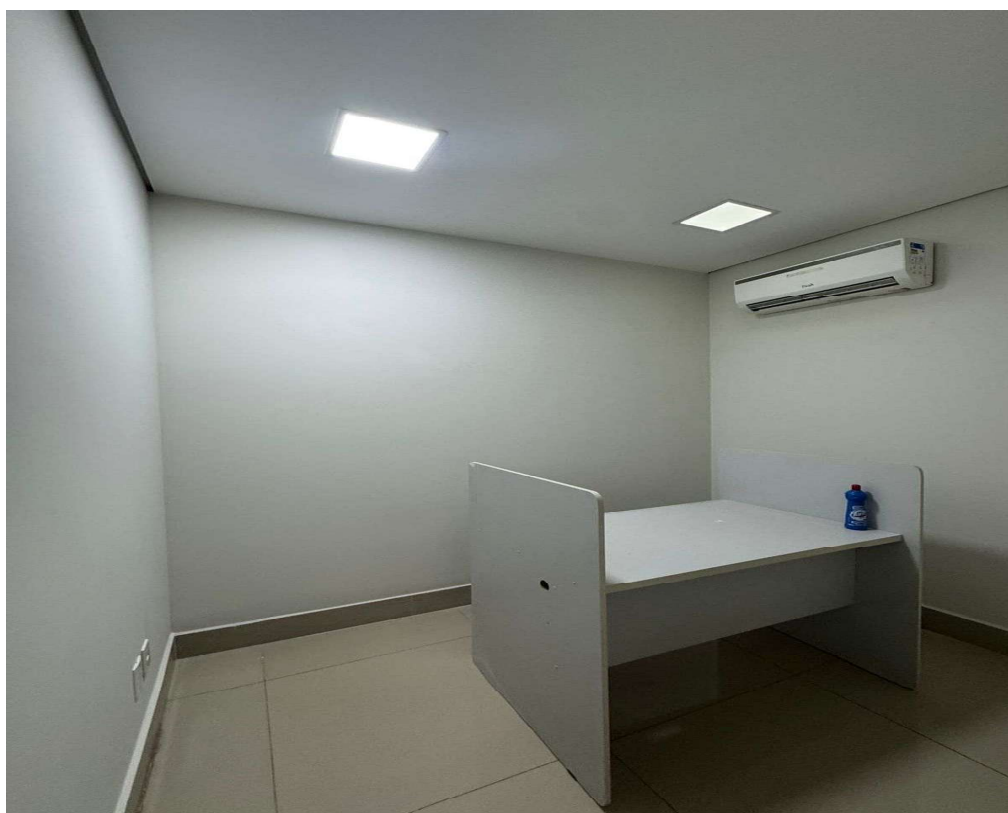


FOTO 30 - EXECUÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. ASSENTAMENTO DE RODAPÉ.



FOTO 31 - EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. ASSENTAMENTO DE RODAPÉ. INSTALAÇÃO DE PORTA.

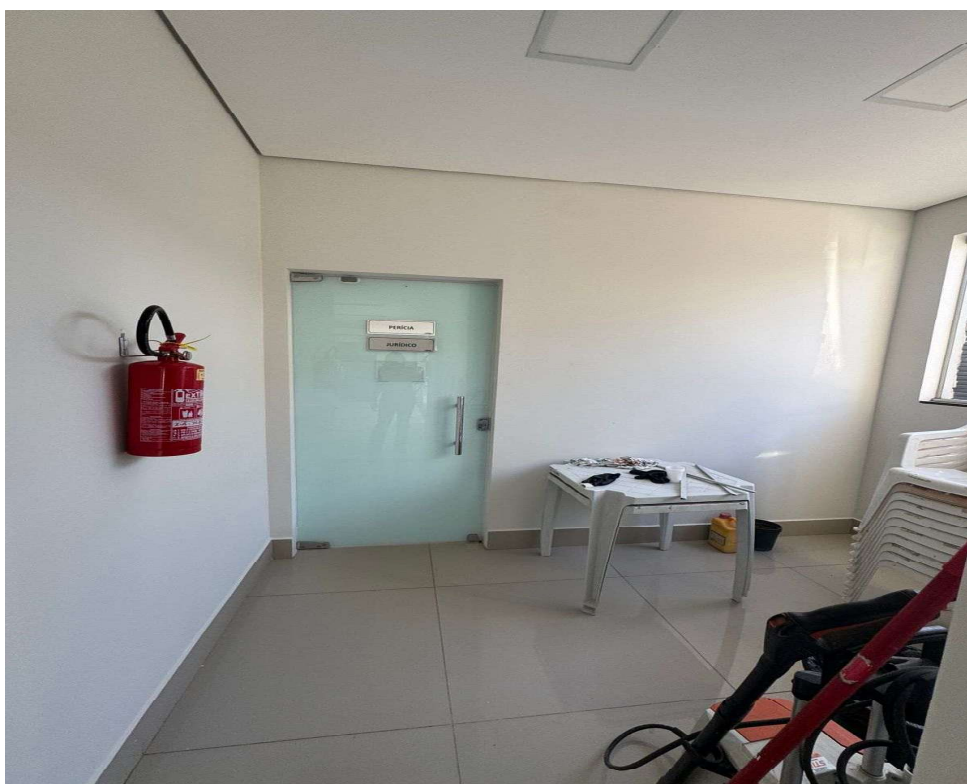


FOTO 32 - EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO.



FOTO 33 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA AR-CONDICIONADO. EXECUÇÃO DE PINTURA.

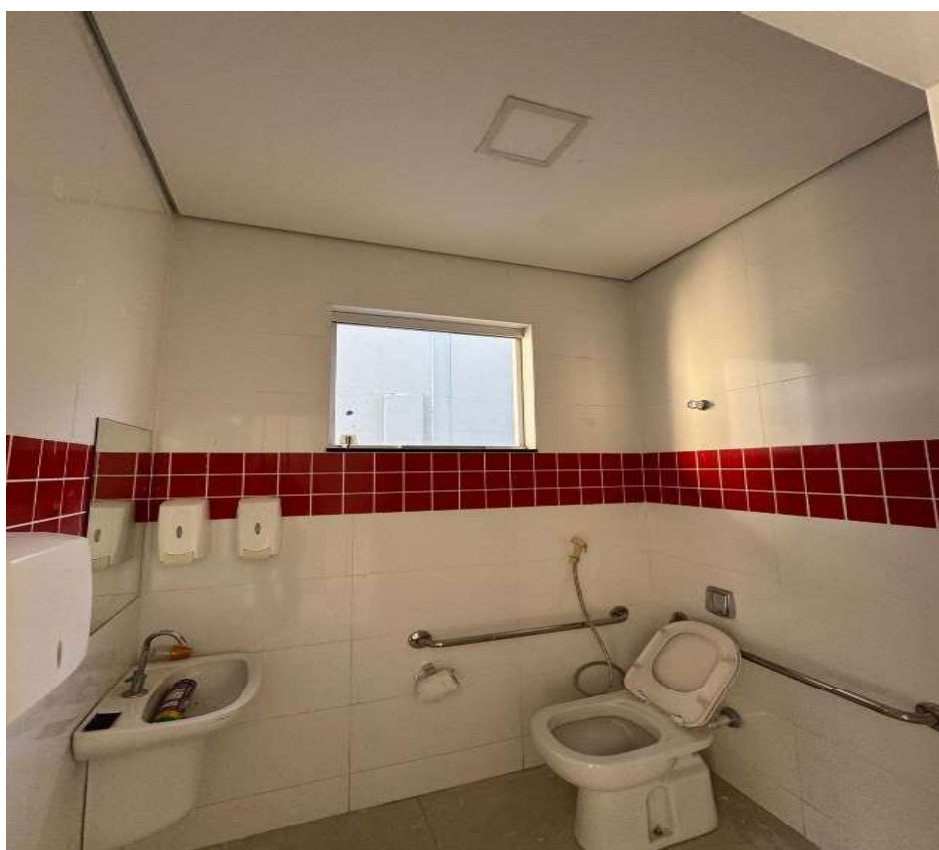


FOTO 34 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA. EXECUÇÃO DE PINTURA.

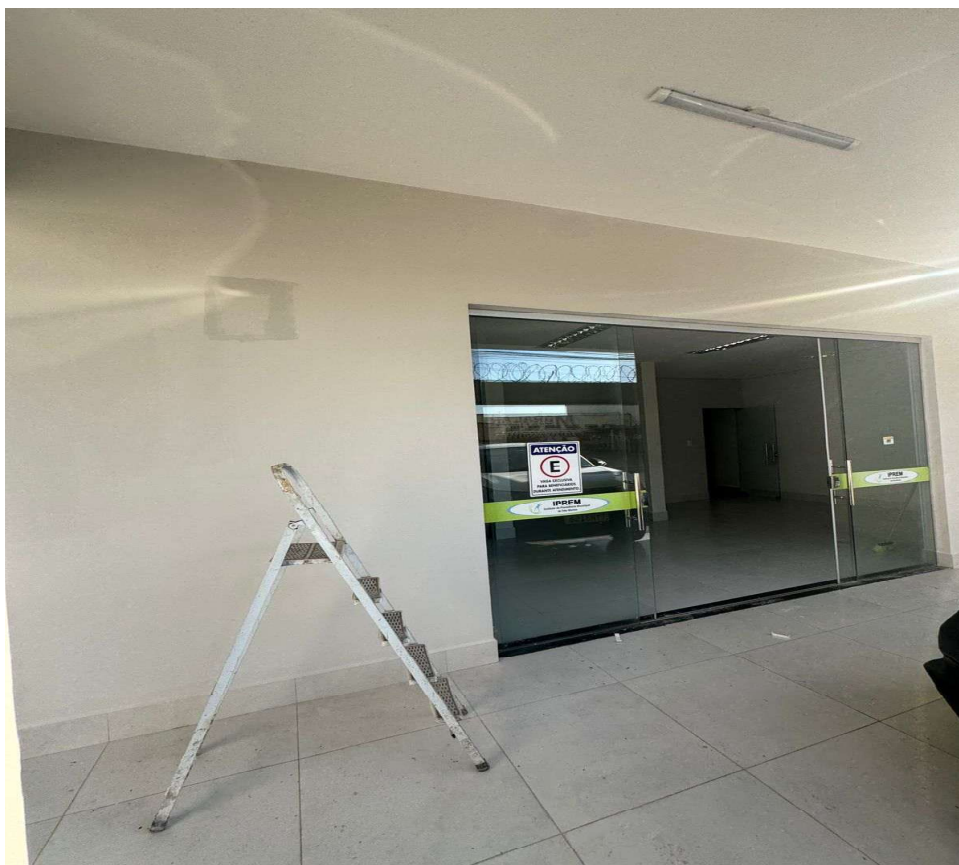


FOTO 35 - EXECUÇÃO DE PINTURA. ASSENTAMENTO DE PISO.



FOTO 36 - ASSENTAMENTO DE PISO. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE PORTAS. INSTALAÇÃO DE EXTINTORES.



FOTO 37 - INSTALAÇÃO DE PERFIS DE LED E SENSORES NA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE.

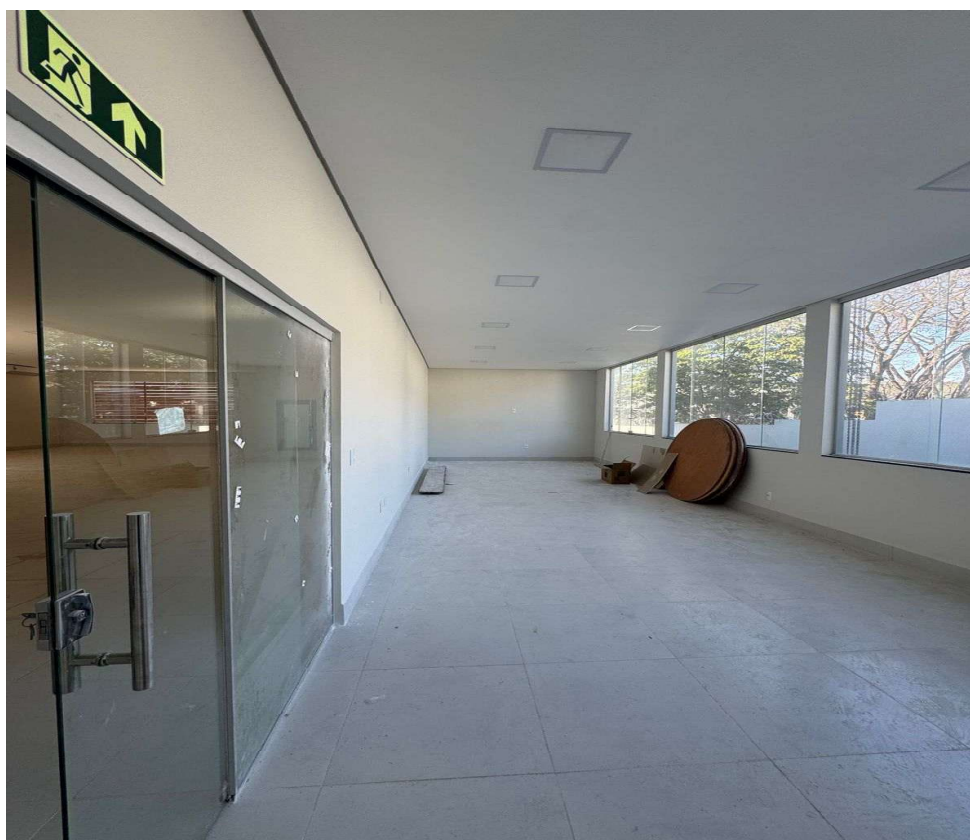


FOTO 38 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO E PAREDES DE DRYWALL - FOI REALIZADA A ADEQUAÇÃO DA PAREDE EM SISTEMA DRYWALL COM INSERÇÃO DE REFORÇOS INTERNOS NA ESTRUTURA, DIMENSIONADOS PARA RECEBER A FIXAÇÃO DOS MÓVEIS PLANEJADOS. ASSENTAMENTO DE PISO E RODAPÉ. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES. INSTALAÇÃO DE PORTA. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.



FOTO 39 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO E PAREDE DE DRYWALL. ASSENTAMENTO DE PISO E RODAPÉ. INSTALAÇÃO DE PORTA. INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. EXECUÇÃO DE PINTURA.

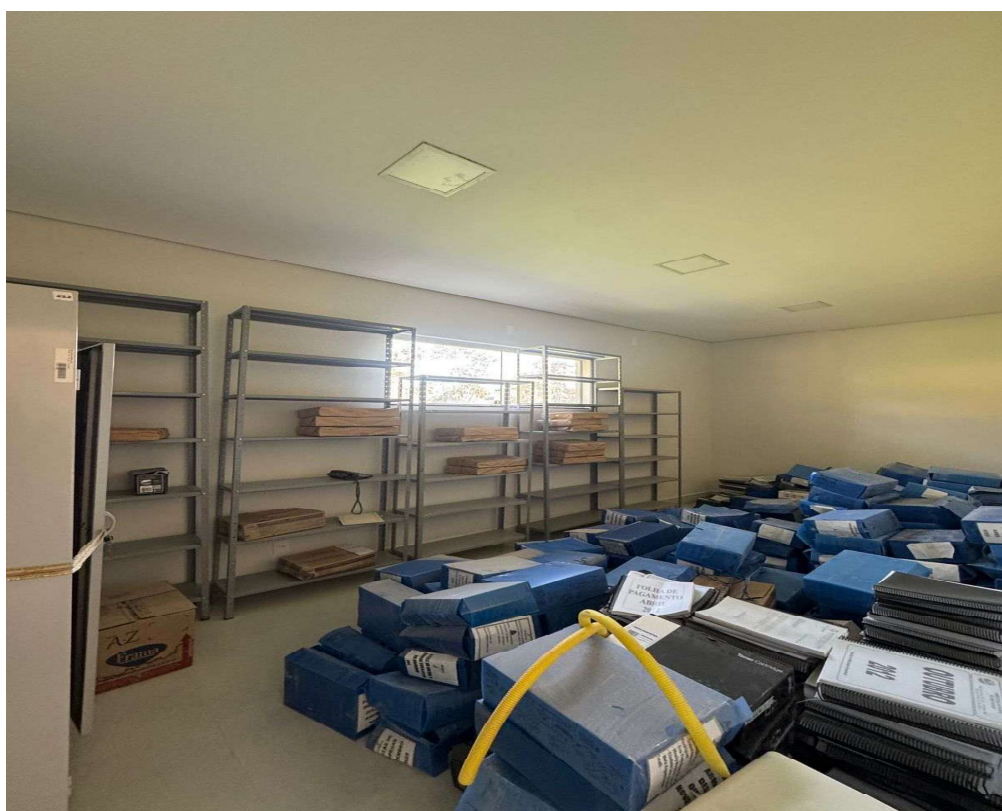


FOTO 40 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.



FOTO 41 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO E PAREDE DE DRYWALL. INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE PORTAS. INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO.



FOTO 42 - ASSENTAMENTO DE PISO. EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES DE INCÊNDIO. EXECUÇÃO DE PINTURA.

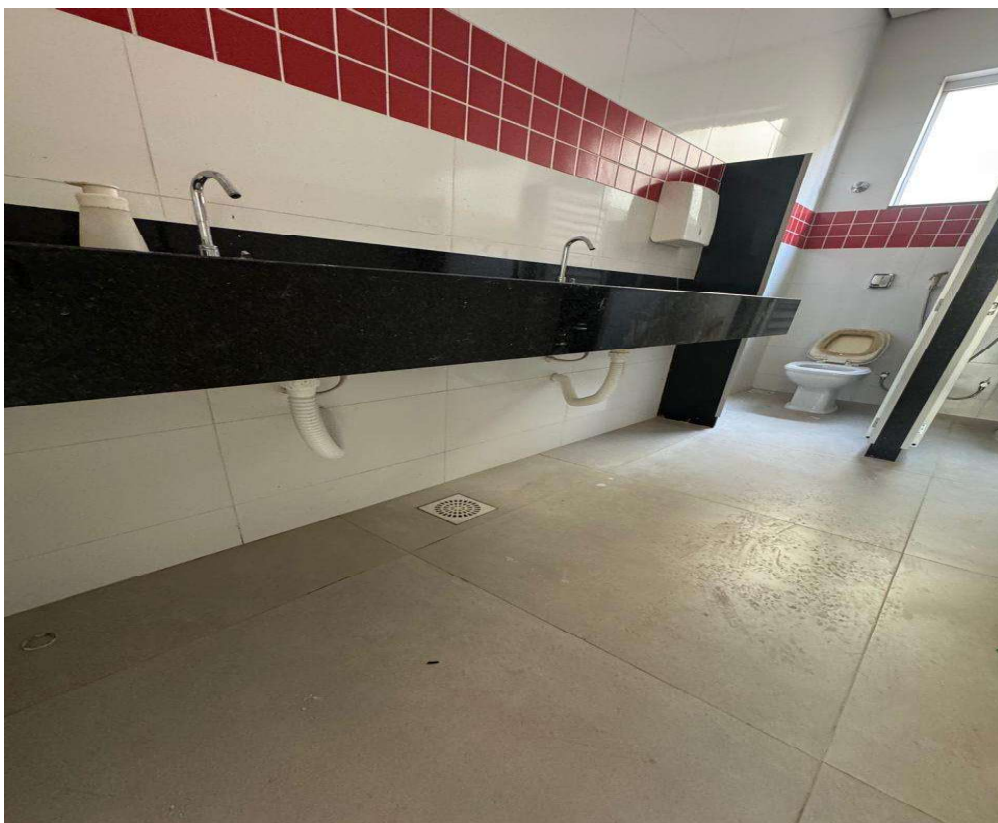


FOTO 43 - INSTALAÇÃO DE SIFÃO. CONTENÇÃO DE VAZAMENTOO NO REGISTRO, FOI EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DESGASTADOS, RESTABELECENDO A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA.



FOTO 44 - ASSENTAMENTO DE PISO. EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO. INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS. INSTALAÇÃO DE BANCADA E LAVATÓRIO. INSTALAÇÃO DE PORTA E JANELA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA. PINTURA.



FOTO 45 - ASSENTAMENTO DE PISO E RODAPÉ. EXECUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE PORTA. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.

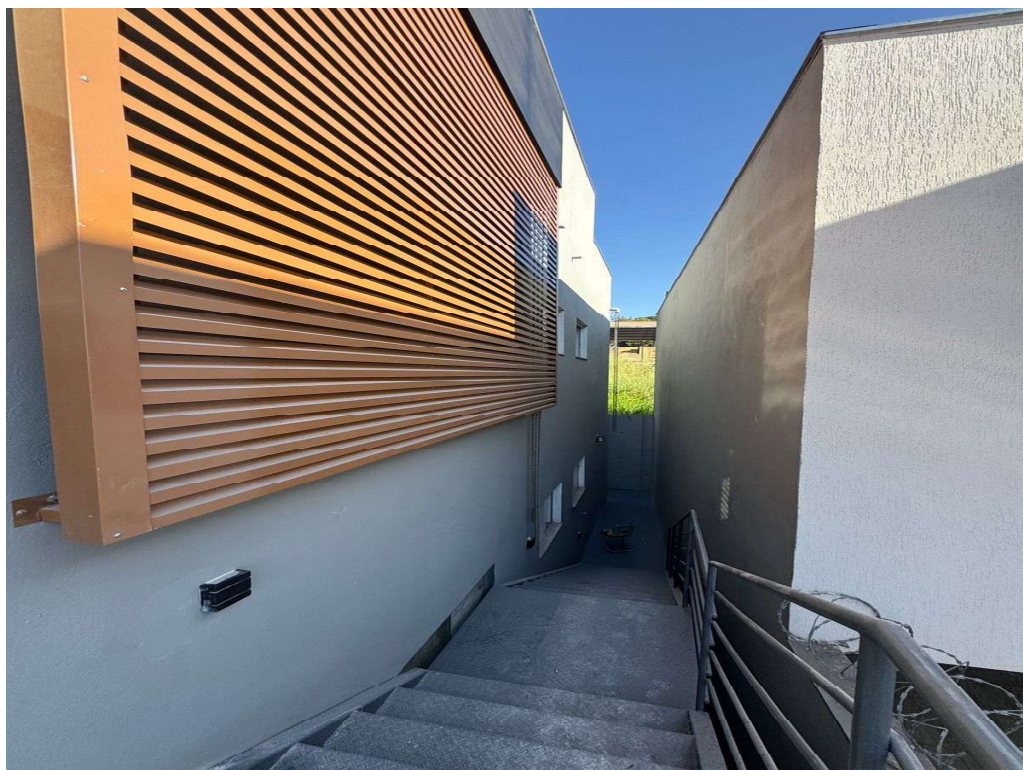


FOTO 46 - EXECUÇÃO DE ESCADA. INSTALAÇÃO DE BRISE E PÓRTICO METÁLICO. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE ARANDELAS E REFLETORES.

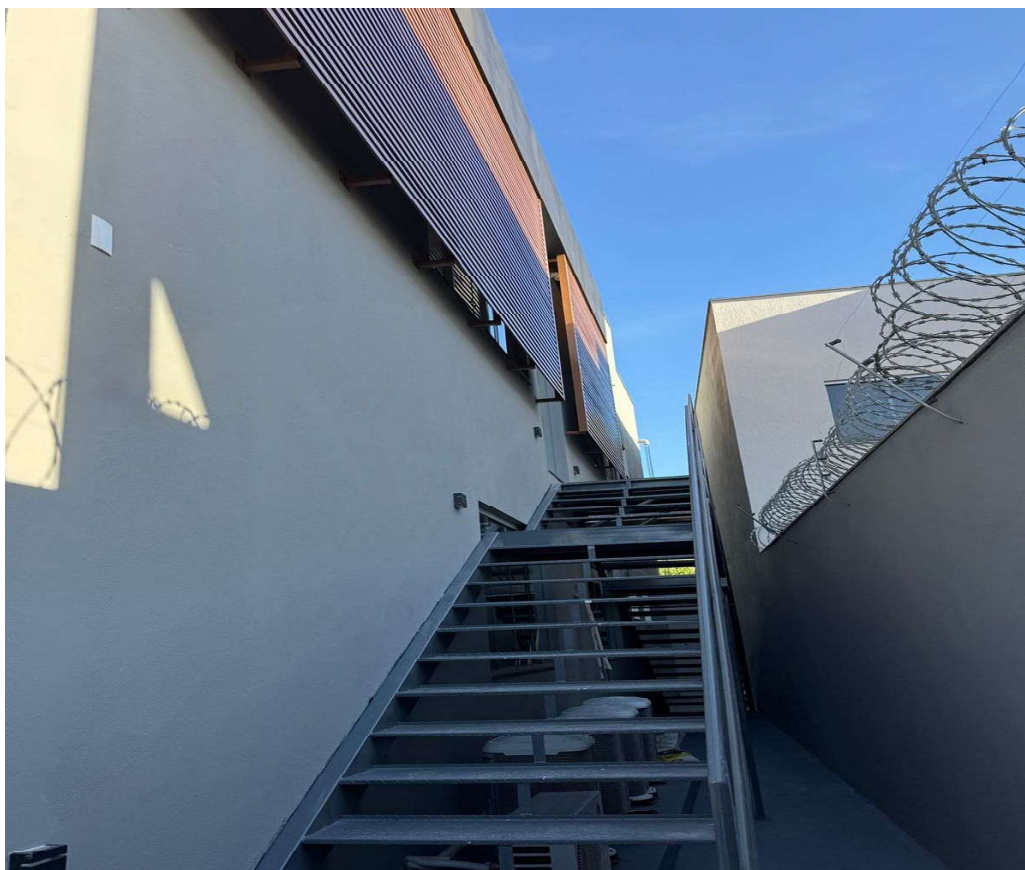


FOTO 47 - INSTALAÇÃO DE BRISE E PÓRTICO METÁLICO. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE ARANDELAS E REFLETORES.

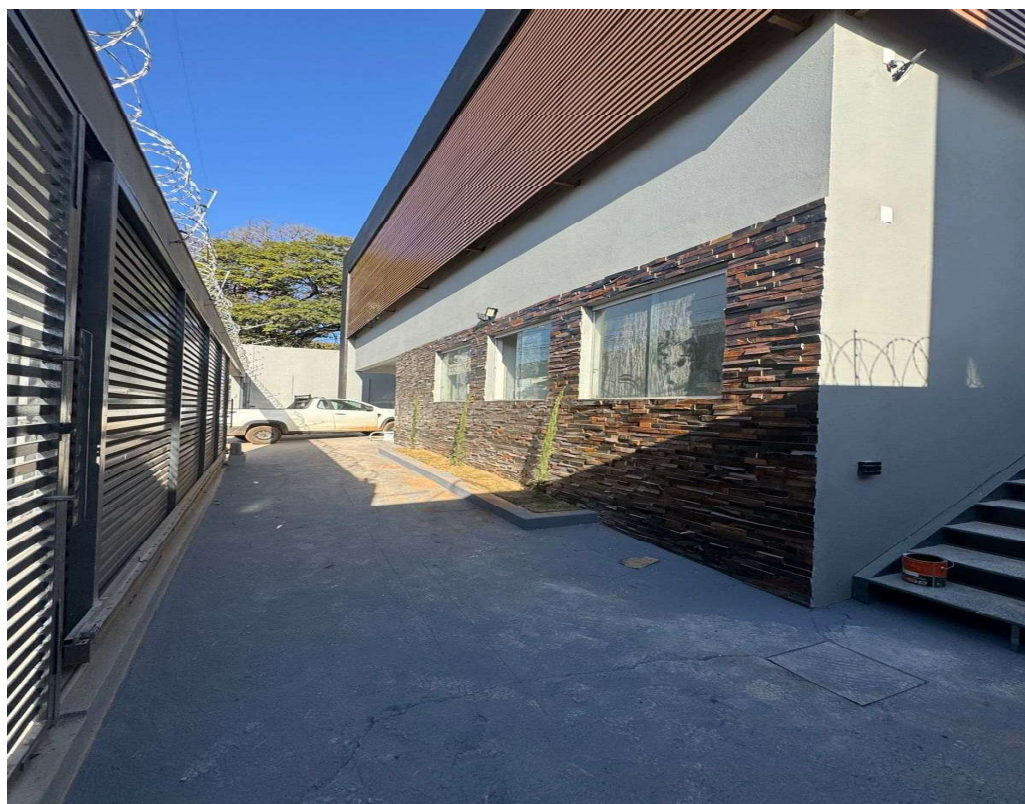


FOTO 48 - INSTALAÇÃO DE BRISE E PÓRTICO METÁLICO. INSTALAÇÃO DE PEDRA FERRO. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE REFLETORES. PINTURA DE PISO. EXECUÇÃO DE CANTEIRO E JARDIM.



FOTO 49 - INSTALAÇÃO DE LETRAS E PERFIS DE LED. EXECUÇÃO DE PINTURA TEXTURIZADA TIPO GRAFIATO.



FOTO 50 - INSTALAÇÃO DE PÓRTICO E BRISE METÁLICO. EXECUÇÃO DE PINTURA. INSTALAÇÃO DE LETRAS E PERFIS DE LED.
